

DATA REMOTE

Nama Pelanggan	: BANK SYARIAH INDONESIA TBK.	Nomor Jaringan	: 2024428443				
Contact Person	: -	Nomor Telepon	: -				
Alamat	: JL sultan hasanudin tambun selatan kabupaten bekasi						
Kota	:	Propinsi	:				
No. SPK	: 306054/WO-LA/2025	Tanggal	: 06-Aug-2025 07:10				
Jam Perintah	: 06-Aug-2025 07:10	Jam Persiapan	: 06-Aug-2025 08:33	Jam Berangkat	: 06-Aug-2025 08:50	Jam Tiba Di Lokasi	: 06-Aug-2025 09:51
Jam Mulai Kerja	: 06-Aug-2025 09:56	Jam Selesai Kerja	: 06-Aug-2025 11:09	Jam Pulang	:	Jam Tiba Di Kantor	:

GLOBAL CHECKLIST

DATA LOKASI		ELECTRICAL				ENVIRONMENT	
Latitude	6°1549292	1. Output Tegangan yg mengacu ke modem				1. AC Pendingin Ruangan	Ada
Longitude	107°356269		PLN	UPS	IT	2. Suhu Ruangan Perangkat	25°
Posisi Modem di Lt.	dilantai	P-N	231.3 VAC	231.3 VAC	231.3 VAC		
Ruang	atm centre	P-G	231.6 VAC	231.6 VAC	231.6 VAC		
		N-G	0.476 VAC	0.476 VAC	0.476 VAC		
		2. Grounding Bar terkoneksi ke					

INDOOR AREA CHECKLIST

PERANGKAT MODEM	QUALITY PARAMETER	STANDARD	QUALITY PARAMETER			
			NMS / ENGINEER	ON SITE / TEKNISI	PERBAIKAN	HASIL AKHIR
Indikator Modem	POWER	ON (Green)				
	109/DCD/LINK-WAN	ON				
Merek :	TD/TXD/103	Blink				
	RD/RXD/104	Blink				
	RTS/105	ON				
	CTS/106	ON				
	Alarm LED	ON				
	Front Panel Display :					
	All STU Modem	Quality A				
	Tainet Scorpio	No Counter CRC Error				
		Connected xxx KBps		Connected KBps		
Modem FO	Optical LED Alarm	Green (ON)				
LC Signal Quality (Checked by Kop)	STU 160	Jangkrik Keras				
	STU 1088/2304	SOS Keras				
	ADSL Modem	Bersih, No Noise				
LC Signal Quality (Checked by AVO Meter)	STU 1088/2304,	400–700 Ω (Tlkm Area)	Ω			
	Tainet	50–200 Ω (HRB Area)	Ω			
	Adtran Express	48-50 VDc (QUAD CES SHDSL)				

LINE CHECKLIST

CHECK POINT	LINE CHECKLIST	STANDARD	EXISTING	PERBAIKAN	HASIL AKHIR
Site Area	Kabel RJ-11	No Berkarat, No Bad Contact/Putus			
	Phone Box	No Berkarat, No Bad Contact/Putus			
	KTB/DP Wall	No Berkarat, No Bad Contact/Putus			
	DP Telkom	No Berkarat, No Bad Contact/Putus			
	Sub Gedung	No Berkarat, No Bad Contact/Putus			
	MDF Gedung	No Berkarat, No Bad Contact/Putus			
	T-Line Gedung	No Grounded, No Noised,Tdk Putus Sedikit Terminasi No Paralel Line Detected Tahanan Loop : 200-400 Ω	Ω		
HRB/R.Lintas	T-Line (TX,LC)	No Grounded, No Noised,Tdk Putus Tahanan Loop : 010-100 Ω	Ω		
	Kabel Data	OK, Tidak Kendor, Tdk Putus			
	Port Sentral	OK, Tidak Kendor, Tdk Putus			
Line FO	Cek Signal FO	OK, Signal Balik, Tidak Putus			
	Koneksi OTB	OK, Tidak Kendor, Tdk Putus			
Tes Konektivitas	Bit Error Rate	Durasi 15 Menit, no error			
	Ping	100 % reply, < 50 ms			

DATA PERANGKAT

EXISTING			TIDAK TERPAKAI		
Nama Barang	No. Reg	S/N	Nama Barang	No. Reg	S/N
BIVOCOM INDUSTRIAL 4G ROUTER 5 PORTS, DUAL SIM, WIFI, DUAL MODUL	B2WS0200137MA0606				
CABUT			PENGANTI / PASANG BARU		
Nama Barang	No. Reg	S/N	Nama Barang	No. Reg	S/N
ADAPTER 12V, 1.5A FOR BIVOCOM	B2WS0200138MA0514 B		ADAPTER 12V, 1.5A FOR BIVOCOM	B2WS0200138MA557B	

Note : pergantian psu

VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN

	PELAKSANA	PELANGGAN	VERIFIKATOR
Nama	Abdul Gunawan ALMAJARA	sulle	
Tanggal	06-Aug-2025 11:09	06-Aug-2025 11:09	
Tanda Tangan	 TKT001/24793977	 306054/WG-LA/2025	

GUIDANCE



Teknisi Yang Aktivasi



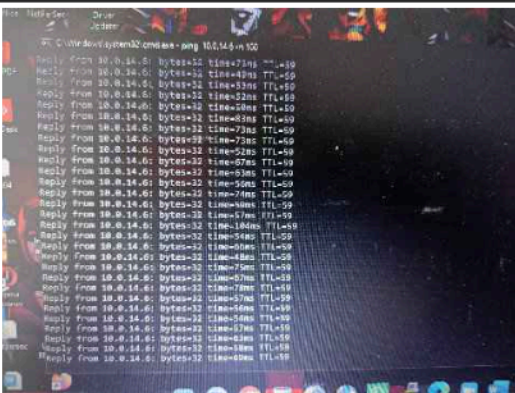
Kondisi Sebelum Perbaikan



Action / Perbaikan



Kondisi Setelah Perbaikan



Test Ping

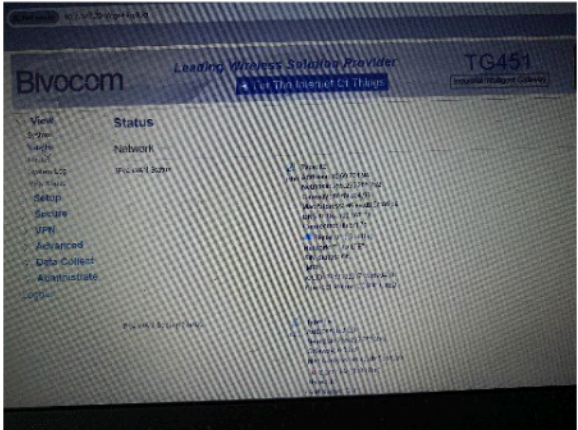
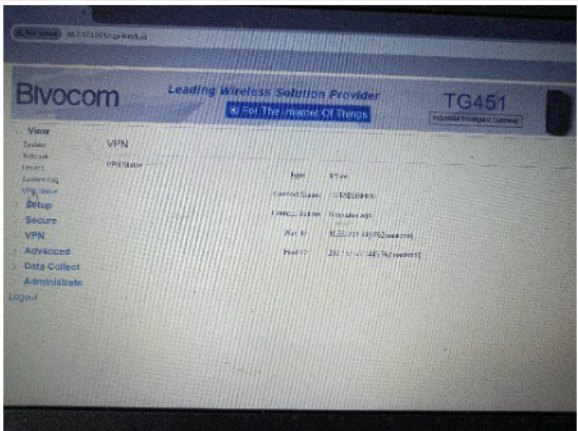
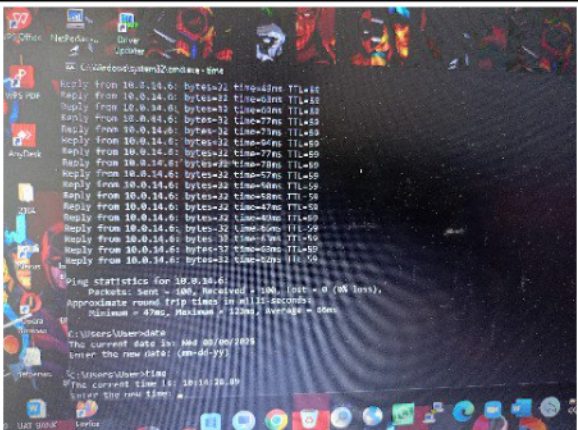


Catuan Listrik

	
Indikator Perangkat	Kondisi Rak/Meja Penempatan Perangkat

LOG

DATE TIME	INFO	PHOTO
06-Aug-2025 09:51	Check In	
06-Aug-2025 09:57	kondisi modem saat tim datang	
06-Aug-2025 10:00	progres pergantian psu	

06-Aug-2025 10:10	kondisi signal di modem aman	
06-Aug-2025 10:11	modem sudah up	
06-Aug-2025 10:14	ping to host normal	
06-Aug-2025 10:24	pengecekan kuota simcard modem 11.84 gb	

06-Aug-2025 10:32	modem sudah up kembali setelah pergantian psu	
06-Aug-2025 10:35	atm sudah online kembali	
06-Aug-2025 10:48	action dilokasi pergantian psu test ping to host pengecekan kuota pengecekan akses	
06-Aug-2025 11:08	atm termonit normal 30 menit	
